RODOVIA FEDERAL: BR-101/PB (KM 88,40 AO KM 92,40)

OBRAS DE MELHORAMENTO

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO

TRECHO EM OBRAS		
Rodovia:		BR-101/PB
Trecho:		DIV RN/PB - DIV PB/PE
Subtrecho:		ENTR BR-101/230 - DISTRITO INDUSTRIAL (TOALIA)
Segmento:		km 88,40 - km 92,40
Códigos SNV:		101BPB0330
Instrumento		ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N 181/2024
Versão do SNV utilizada:		202504A
Extensão:		0,417 km
Lote(s):		Único
Largura da Faixa de Domínio	Esquerdo	40
	Direito	30
DADOS DA SR/DNIT		
UF:		PB
Endereço completo:		Av. Coronel Estevão D' Ávilla Lins, 392 - Bairro Cruz das Armas - João Pessoa - PB, CEP 58085-010
Telefone e e-mail:		telefone: (83) 3215-8300 / 8301 / E-mail: srpb@dnit.gov.br
Nome do Superintendente:		Arnaldo Monteiro Costa
Pessoa de Contato(nome):		Ricardo José De Araujo
DADOS DA CONSTRUTORA		
Razão Social:		PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA
CNPJ:		10.978.682/0001-65
Endereço:		Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE
DADOS DA SUPERVISORA DE OBRAS		
Razão Social:		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA
CNPJ:		09.122.706/0001-09
Endereço:		Av. Min. José Américo de Almeida, SN - Centro, João Pessoa - PB, 58040-300

2. CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Serviços abrangidos	**Descrição dos serviços**
	Alargamento da plataforma da rodovia para implantação de acostamento e de terceira faixa, englobando a execução da estrutura do pavimento e, se necessário, da infraestrutura para esses serviços.
	Implantação de vias marginais em travessias urbanas.
X	Implantação, substituição ou alargamento de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e cortinas de concreto.
	Implantação de estruturas e muros de contenção.
	Implantação de edificações necessárias à operação da via, tais como bases operacionais, postos de polícia rodoviária, praças de pedágio, balanças rodoviárias.
	Implantação, modificação ou remanejamento de interseções e acessos.
	Implantação de estruturas de fibra óptica a serem utilizadas para a operação rodoviária.

3. INTERVENÇÕES DA FAIXA DE DOMÍNIO

Característica	**Descrição**
O empreendimento causa impacto direto em Unidade de Conservação (UC)?	Não se aplica
O empreendimento está localizado em Zona de Amortecimento (ZA) de Unidade de Conservação?	Não se aplica

O empreendimento está localizado no limite de até 2 mil metros da UC, cuja ZA não tenha sido estabelecida no prazo de até 5 anos a partir da data da publicação, ou seja, 14/12/2015, da Resolução Conama n° 473, de 11 de dezembro de 2015?	Não se aplica
O empreendimento localiza-se em terra indígena ou apresenta elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra indígena, considerando os limites de 40km para a Amazônia Legal e 10 km para demais regiões?	Não se aplica
O empreendimento localiza-se em território quilombola ou apresenta elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra indígena, considerando os limites de 40km para a Amazônia Legal e 10 km para demais regiões?	Não se aplica
A área de influência direta da atividade ou o empreendimento localiza-se em área onde foi constatada a ocorrência dos bens culturais acautelados (bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924/1961; bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25/1937; bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551/2000; e bens valorados nos termos da Lei nº 11.483/2007)?	Não se aplica
A atividade ou o empreendimento localiza-se em municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária?	Não se aplica

4. **INTERVENÇÕES EM ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS**

Característica	Descrição
Áreas de Preservação Permanente	Não se aplica
Áreas Inundáveis	Não se aplica
Mangue	Não se aplica
Dunas	Não se aplica
Restinga	Não se aplica
Veredas	Não se aplica
Salgado ou marismas tropicais hipersalinos	Não se aplica
Apicum	Não se aplica
Remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica	Não se aplica
Nascentes e próximo a cursos d'água perenes ou intermitentes	Não se aplica
Áreas de importância estratégica para a recarga hídrica, como os mananciais para o abastecimento público	Não se aplica
Áreas suscetíveis a erosão dos solos e com declividade acentuada	Não se aplica
Próximo a áreas com informação sobre a presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, legalmente protegidas e/ou de especial interesse conservacionista	Não se aplica
Unidades de conservação e zona de amortecimento	Não se aplica
Corredores ecológicos	Não se aplica
Terras indígenas	Não se aplica
Próximo a habitações de populações tradicional	Não se aplica
Locais de importância estratégica para a conservação da biodiversidade e de proteção de recursos hídricos	Não se aplica
Próximo a sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, a exemplo de sítios arqueológicos e paleontológicos	Não se aplica

5. **LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE APOIO NECESSÁRIAS, DOS LOCAIS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO**



Figura 01 - Localização georreferenciada do canteiro da obra na escala 1:50m.



Figura 02 - Vista aérea da obra.

6. MEDIDAS DE CONTROLE ESPECÍFICAS E PROGRAMAS RELACIONADOS

Programa Relacionado	Descrição do Programa
X	Programa ambiental de construção (PAC)
X	Programa de monitoramento, prevenção e controle de processos erosivos (PMPCPE)
	Programa de supressão de vegetação e afugentamento de fauna (PSVAF)
X	Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD)
	Programa de monitoramento, prevenção e controle de atropelamentos de fauna silvestre (PMPCAFS)
	Programa de recuperação/mitigação de passivos ambientais (PRMPA)
X	Programa de Gestão Ambiental (PGA)
	Programa de Ações Emergenciais (PAE)
X	Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social (PEACS)
	Programa de Melhorias de Acesso e Travessias Urbanas (PMATU)
	Programa de Remoção e Realocação de População (PRRP)*

** Caso verificada a necessidade de realocação e remoção de populações.*

OBS: Por se tratar de obra pontual com 417m de extensão (BR-101, km 89,70 ao km 90,12), inserida em zona urbana extremamente adensada, a implementação do Programa de supressão de vegetação e afugentamento de fauna (PSVAF) não se tornou necessária, sendo complementada com os programas PGA e PEACS.

Medidas Adotadas (Marcar com “x”)	Medidas Preventivas e de Controle Ambiental
Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
X	Reduzir a geração de resíduos sólidos.
	Segregar os resíduos perigosos dos não perigosos.
X	Segregar os resíduos recicláveis dos não recicláveis.
X	Realizar a triagem e o acondicionamento adequado de resíduos sólidos gerados.
X	Realizar o armazenamento temporário adequado dos resíduos.
X	Fomentar ações educativas quanto à Gestão de Resíduos Sólidos.
X	Implantar a coleta seletiva.
	Usar papéis recicláveis no escritório.
X	Inibir o uso de copos plásticos descartáveis.
X	Destinar adequadamente os resíduos gerados, em conformidade com a legislação vigente.
	Manter arquivo dos Manifestos de Transporte de Resíduos ou documento equivalente.
	Separar, acondicionar e dar a destinação adequada aos resíduos de serviços de saúde.
Gerenciamento de Efluentes Líquidos	
X	Reduzir a geração de efluentes líquidos.
X	Coletar os efluentes dos banheiros químicos.
X	Verificar continuamente a eficiência das fossas implantadas.
X	Fazer manutenção dos equipamentos de coleta continuamente para evitar vazamentos e contaminação.

X	Acompanhar o recolhimento dos efluentes por empresas especializadas e cobrar a licença das mesmas.
X	Manter a caixa separadora sempre limpa.
	Evitar jogar óleo nas pias do refeitório.
	Recolher todo o óleo usado da cozinha e enviar para entidades recicladoras ou fábricas de sabão artesanal.
	Reservar um local para lavagem dos veículos, e assegurar que seja coletada toda água de lavagem.
X	Destinar adequadamente os efluentes, em conformidade com a legislação vigente.
Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos na Qualidade da Água	
	Obter outorga para uso de água ao órgão competente.
	Monitorar o fluxo de caminhões e proibir que os trabalhadores joguem lixo nas encostas de recursos d'água adjacentes.
	Monitorar a existência de nascentes ou cursos d'água adjacentes
X	Fazer manutenção dos equipamentos continuamente para evitar vazamentos e contaminação.
X	Acompanhar o recolhimento dos efluentes por empresas especializadas e cobrar a licença das mesmas.
X	Fazer uso exclusivo de banheiros químicos.
	Reservar um local para lavagem dos veículos, e assegurar que seja coletada toda água de lavagem.
	Usar diques de contenção e obras de drenagem para minimizar carreamento de sedimentos para o corpo hídrico.
	Implantar sistemas de drenagem para minimizar carreamento de sedimentos das obras para o corpo hídrico.
X	Fazer campanhas de conscientização do uso racional da água com os Trabalhadores.
	Não dispor resíduos próximos aos cursos d'água.
Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos causados pela Emissão de Particulados na Atmosfera, por Ruídos e Vibrações	
X	Lavar periodicamente os equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de sedimentos transportados para as vias.
X	Proteger com lonas todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, evitando-se a emissão de poeira em suspensão.
	Umidificar as vias de acesso às obras e os desvios de tráfego não pavimentados, através de caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira em suspensão.
X	Executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos para que se minimize a emissão de gases poluentes.
X	Planejar o trajeto dos veículos, de modo a minimizar o trânsito de veículos pesados em centros habitados e áreas urbanas.
X	Evitar que os veículos em operação na obra causem distúrbios à comunidade, tais como ruídos excessivos, poeira ou lama nas vias Públicas.
X	Transportar e descarregar materiais originários ou com destino à obra em locais previamente definidos.
	Outras medidas:

Medidas Adotadas (Marcar com "x")	Medidas Preventivas e de Controle Ambiental
X	Promover inspeções periódicas na obra com vistas a acompanhar o desencadeamento e evolução dos processos erosivos
	Implantar taludes com inclinação adequada e realizar a reconformação dos mesmos
	Promover procedimentos de controle de assoreamento e formação de processos erosivos nas atividades potencialmente impactantes aos corpos hídricos
	Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro
	Promover a limpeza e o preparo do terreno de forma adequada (sem utilização de agrotóxicos, queimadas e correntão)
	Realizar periodicamente a limpeza e manutenção das estruturas de drenagem
	Dispor e destinar adequadamente os materiais oriundos da limpeza e destocamento
	Recompor as áreas expostas com vegetação
	Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das margens dos cursos hídricos
	Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro
	Implantar ou substituir os dispositivos de drenagem pluvial dotados de controle de processos erosivos
	Implantar sistemas de proteção de taludes (terraceamento, revegetação, etc)
X	Promover a conservação dos caminhos de serviço, acessos e drenagens, para evitar a instalação de processos erosivos;
	Implantar sistemas de proteção contra erosão nos pontos de descarga de sarjetas e valetas no terreno natural, através da disposição de brita, grama ou caixas de dissipação de energia
	Outras medidas:

Medidas Adotadas (Marcar com "x")	Medidas Preventivas e de Controle Ambiental
X	Limpeza da área com retirada das sobras de materiais abandonados, demolição e remoção dos remanescentes de estruturas
	Reconformação da topografia, mediante atenuação dos taludes, drenagem das depressões que acumulam água e implantação de sistema de drenagem
	Realização da raspagem e adequada estocagem da camada fértil superficial do solo
	Preparação do solo, reposição do solo fértil estocado e aplicação dos adubos e corretivos
	Adoção de técnicas de exploração de pedreiras que favoreçam a recuperação da área degradada (cortes em bancada, tipo escadaria, p.ex.)

7. CRONOGRAMA DE OBRAS

Informa-se que de acordo com o documento (SEI nº 21000686), a obra em análise teve sua ordem de início definida no dia 03/07/2023 (O.S. 013/2023), com previsão de término das intervenções para dia 24/12/2024, contudo foi prorrogada para o dia 22/07/2025 (Termo aditivo 01). Apesar do início dos serviços ocorrerem em Julho/2023, os serviços executados especificamente dentro da faixa de domínio só tiveram inicio em Novembro/2024 com previsão de finalização em Julho/2025, conforme cronograma em anexo (SEI nº 21167343).

OBRAS DE MELHORAMENTO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

TRECHO EM OBRAS		
Rodovia:		BR-230/PB
Trecho:		Porto Cabedelo - Div PB/CE
Subtrecho:		Porto (Cabedelo) - Entr BR 101
Segmento:		km 24
Códigos SNV:		101BPB0330
Instrumento		ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N 109/2022
Versão do SNV utilizada:		202504A
Extensão:		Estaca 1200 a 1235
Lote(s):		Único
Largura da Faixa de Domínio	Esquerdo	
	Direito	
DADOS DA SR/DNIT		
UF:		PB
Endereço completo:		Av. Coronel Estevão D' Ávilla Lins, 392 - Bairro Cruz das Armas - João Pessoa - PB, CEP 58085-010
Telefone e e-mail:		telefone: (83) 3215-8300 / 8301 / E-mail: srpb@dnit.gov.br
Nome do Superintendente:		Arnaldo Monteiro Costa
Pessoa de Contato(nome):		Ricardo José De Araujo
DADOS DA CONSTRUTORA		
Razão Social:		Construtora Luis Costa LTDA
CNPJ:		00.779.059/0006-34
Endereço:		Cachoeira Lisa , SN, ZONA RURAL , Tavares PB
DADOS DA SUPERVISORA DE OBRAS		
Razão Social:		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA
CNPJ:		09.122.706/0001-09
Endereço:		Av. Min. José Américo de Almeida, SN - Centro, João Pessoa - PB, 58040-300

Medidas Adotadas (Marcar com "x")	Medidas Preventivas e de Controle Ambiental
Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
X	Reduzir a geração de resíduos sólidos.
	Segregar os resíduos perigosos dos não perigosos.
X	Segregar os resíduos recicláveis dos não recicláveis.
X	Realizar a triagem e o acondicionamento adequado de resíduos sólidos gerados.
X	Realizar o armazenamento temporário adequado dos resíduos.
X	Fomentar ações educativas quanto à Gestão de Resíduos Sólidos.
X	Implantar a coleta seletiva.
	Usar papéis recicláveis no escritório.
X	Inibir o uso de copos plásticos descartáveis.
X	Destinar adequadamente os resíduos gerados, em conformidade com a legislação vigente.
	Manter arquivo dos Manifestos de Transporte de Resíduos ou documento equivalente.
	Separar, acondicionar e dar a destinação adequada aos resíduos de serviços de saúde.
Gerenciamento de Efluentes Líquidos	
X	Reduzir a geração de efluentes líquidos.
	Coletar os efluentes dos banheiros químicos.
	Verificar continuamente a eficiência das fossas implantadas.
	Fazer manutenção dos equipamentos de coleta continuamente para evitar vazamentos e contaminação.
	Acompanhar o recolhimento dos efluentes por empresas especializadas e cobrar a licença das mesmas.
X	Manter a caixa separadora sempre limpa.
	Evitar jogar óleo nas pias do refeitório.
	Recolher todo o óleo usado da cozinha e enviar para entidades recicladoras ou fábricas de sabão artesanal.
	Reservar um local para lavagem dos veículos, e assegurar que seja coletada toda água de lavagem.
X	Destinar adequadamente os efluentes, em conformidade com a legislação vigente.
Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos na Qualidade da Água	
X	Obter outorga para uso de água ao órgão competente.
	Monitorar o fluxo de caminhões e proibir que os trabalhadores joguem lixo nas encostas de recursos d'água adjacentes.
	Monitorar a existência de nascentes ou cursos d'água adjacentes.
X	Fazer manutenção dos equipamentos continuamente para evitar vazamentos e contaminação.
	Acompanhar o recolhimento dos efluentes por empresas especializadas e cobrar a licença das mesmas.
	Fazer uso exclusivo de banheiros químicos nas frentes de obras.

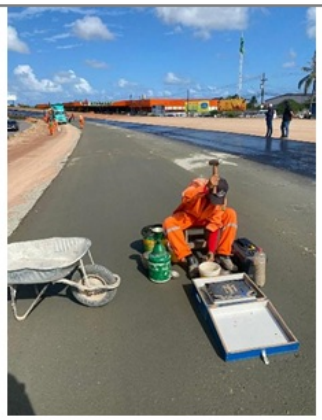
	Reservar um local para lavagem dos veículos, e assegurar que seja coletada toda água de lavagem.
	Usar diques de contenção e obras de drenagem para minimizar carreamento de sedimentos para o corpo hídrico.
X	Implantar sistemas de drenagem para minimizar carreamento de sedimentos das obras para o corpo hídrico.
X	Fazer campanhas de conscientização do uso racional da água com os Trabalhadores.
	Não dispor resíduos próximos aos cursos d'água.
Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos causados pela Emissão de Particulados na Atmosfera, por Ruídos e Vibrações	
X	Lavar periodicamente os equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de sedimentos transportados para as vias.
X	Proteger com lonas todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, evitando-se a emissão de poeira em suspensão.
	Umidificar as vias de acesso às obras e os desvios de tráfego não pavimentados, através de caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira em suspensão.
X	Executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos para que se minimize a emissão de gases poluentes.
X	Planejar o trajeto dos veículos, de modo a minimizar o trânsito de veículos pesados em centros habitados e áreas urbanas.
X	Evitar que os veículos em operação na obra causem distúrbios à comunidade, tais como ruídos excessivos, poeira ou lama nas vias Públicas.
X	Transportar e descarregar materiais originários ou com destino à obra em locais previamente definidos.
	Outras medidas:

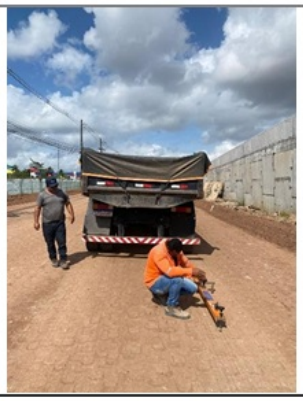
Indicadores Avaliados no PAC

Indicador	Valor
Volume encaminhado para reaproveitamento ou reciclagem / volume dos resíduos gerados nas obras	Para o ano de 2025 o volume de bota-fora gerado foi em torno de 1.232 m^3.
Volume de efluentes tratados / volume de efluentes gerados no período	0/0
Nº de não conformidades atendidas/Nº de não conformidades emitidas	0/0

Relatório fotográfico medidas de controle Ambiental adotadas no PAC

Descrição das Atividades/Medidas Adotadas	Registro Fotográfico
Medidas Preventivas e de Controle Ambiental e Monitoramento e Controle de Processos Erosivos • Execução de drenagem profunda de uma galeria de rede pluvial longitudinal em vala de corpo estradal.	
Medidas Preventivas e de Controle Ambiental e Monitoramento e Controle de Processos Erosivos • Vista longitudinal com o selante de forma a garantir a estanqueidade do instrumento de drenagem subterraneo.	
Medidas Preventivas e de Controle Ambiental e Monitoramento e Controle de Processos Erosivos • Execução de caixa de passagem / poço de visita em concreto armado integrada a galeria de drenagem pluvial.	

Medidas Preventivas e de Controle Ambiental. • Ensaio do teor de umidade/densidade *in situ,* para o controle tecnológico da pavimentação e verificação da qualidade da camada recém-executada de base estabilizada, sub-base e base com atendimento as normas de engenharia rodoviária.	

Monitoramento e Controle Ambiental da Obra • Controle geométrico e altimétrico com auxílio de nível óptico para conferência da camada de terraplenagem referente a regularização do subleito da execução da sub-base/base granular.	

Monitoramento e Controle Ambiental da Obra • Execução de revestimento asfáltico com lançamento e espalhamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).	

Medidas Preventivas e de Controle Adotadas no PPMCE

Medidas Adotadas (Marcar com "x")	Medidas Preventivas e de Controle Ambiental
X	Promover inspeções periódicas na obra com vistas a acompanhar o desencadeamento e evolução dos processos erosivos
	Implantar taludes com inclinação adequada e realizar a reconformação dos mesmos
X	Promover procedimentos de controle de assoreamento e formação de processos erosivos nas atividades potencialmente impactantes aos corpos hídricos
	Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro
	Promover a limpeza e o preparo do terreno de forma adequada (sem utilização de agrotóxicos, queimadas e correntão)
X	Realizar periodicamente a limpeza e manutenção das estruturas de drenagem
X	Dispor e destinar adequadamente os materiais oriundos da limpeza e destocamento
	Recompor as áreas expostas com vegetação
	Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das margens dos cursos hídricos
	Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro
X	Implantar ou substituir os dispositivos de drenagem pluvial dotados de controle de processos erosivos
	Implantar sistemas de proteção de taludes (terraceamento, revegetação, etc)
X	Promover a conservação dos caminhos de serviço, acessos e drenagens, para evitar a instalação de processos erosivos;
X	Implantar sistemas de proteção contra erosão nos pontos de descarga de sarjetas e valetas no terreno natural, através da disposição de brita, grama ou caixas de dissipação de energia
	Outras medidas:

Indicadores avaliados no PPMCE

Indicador	Valor
Número de novos processos erosivos tratados em decorrência das medidas ambientais adotadas pelo programa / nº de processos erosivos identificados	0/0
Comparativo entre o nº de processos erosivos do RARA atual X RARA anterior	0/0
Registros de não conformidade atendidos / registros de não conformidade emitidos	0/0
Relação entre drenagem executada / drenagem prevista	2/3

Medidas Preventivas e de controle Ambiental adotadas no PRAD

Medidas Adotadas (Marcar com "x")	Medidas Preventivas e de Controle Ambiental
X	Limpeza da área com retirada das sobras de materiais abandonados, demolição e remoção dos remanescentes de estruturas
	Reconformação da topografia, mediante atenuação dos taludes, drenagem das depressões que acumulam água e implantação de sistema de drenagem

	Realização da raspagem e adequada estocagem da camada fértil superficial do solo
	Preparação do solo, reposição do solo fértil estocado e aplicação dos adubos e corretivos
	Adoção de técnicas de exploração de pedreiras que favoreçam a recuperação da área degradada (cortes em bancada, tipo escadaria, p.ex.)
X	Implantação de dispositivos de drenagem superficial nas áreas degradadas a serem recuperadas
	Implantação de cobertura vegetal por meio de hidrossemeadura
	Implantação de cobertura vegetal por meio de plantio de árvores e arbustos
	Inspeção da implantação da cobertura vegetal
	Manutenção da implantação da cobertura vegetal por meio de adubação
	Monitoramento das áreas degradadas e de sua recuperação
	Outras medidas:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou as medidas de controle ambiental adotadas nas obras amparadas pela Autorização de Operação, conforme os Programas Ambientais aprovados pelo Ibama e os ajustes indicados no referido documento autorizativo.

Anexos

Figura 01: Mapa de situação – Localização temporário do Bota-Fora (Depósito de Material Excedente) utilizado pela CLC contratada pelo DER/PB.



Figura 02: Mapa de situação – Localização do Bota-Fora destino final utilizado pela CLC contratada pelo DER/PB.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo José De Araujo**, **Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 13/05/2026, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24706761** e o código CRC **B9749BD0**.

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Av. Coronel Estevão D Ávilla Lins, 392
CEP 58.085-010
João Pessoa/PB |
